


- Beendet
- Überfällig
- Läuft
- Nicht Begonnen

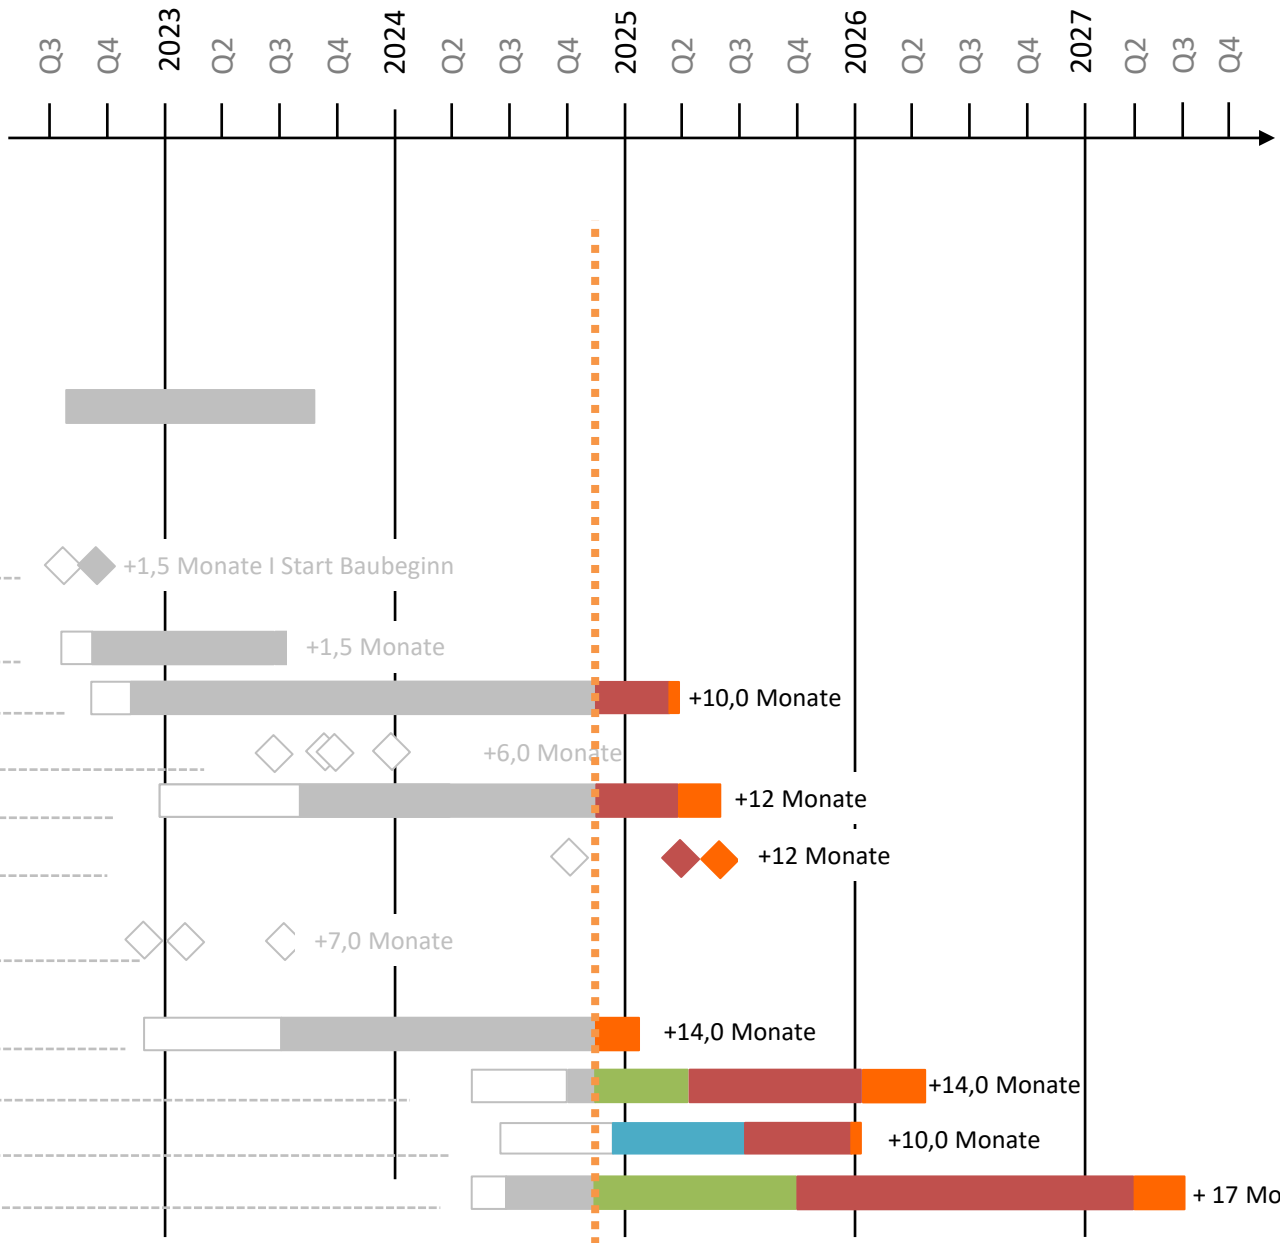

Vorbereitende Maßnahmen

- Freigabe Entwurfsplanung im PBAR
- Abbruch Hertie-Gebäude
- Genehmigungsplanung bis Vergabe
- Einreichung Bauantrag

Rathauszentrum II

- Entkernung und Rohbau
- Herstellen der neuen Technikzentrale
- Übergabe Grundstück Stadthotel
- Umbau/Ausbau EG, 1.OG, Dreieck
- Aufstockung

Rathauszentrum I

- Umbau 4.OG (Neue EDV Abteilung)
- Umbau 1. OG
- Umbau Mall
- Umbau 2.-5. OG
