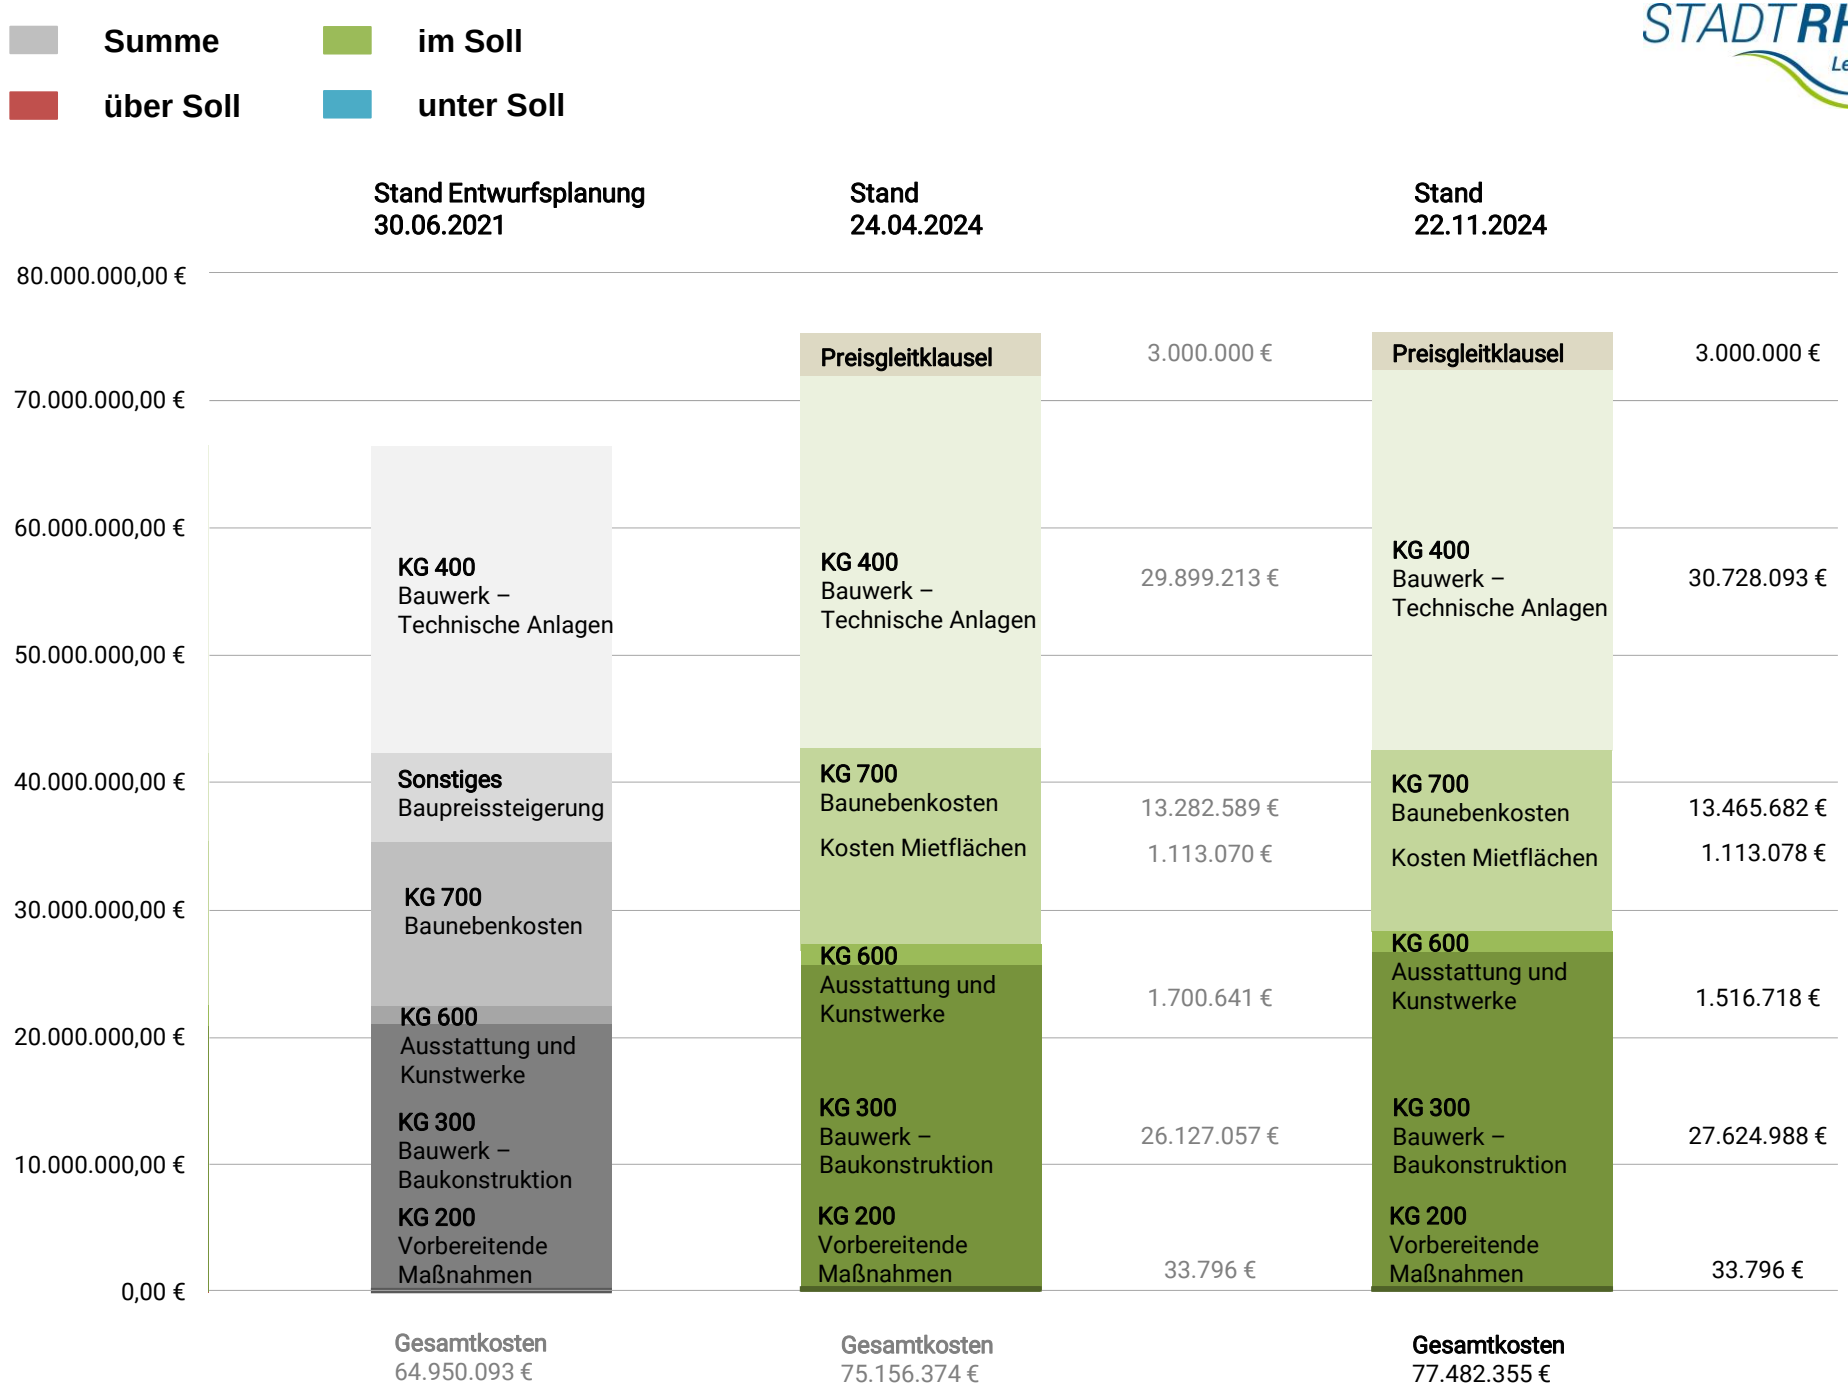
Summe
im Soll
über Soll
unter Soll
Stand Entwurfsplanung 30.06.2021
Stand 24.04.2024
Stand 22.11.2024
80.000.000,00 €
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
Sonstiges Baupreissteigerung
KG 700 Baunebenkosten
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Preisgleitklausel
3.000.000 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
29.899.213 €
KG 700 Baunebenkosten
13.282.589 €
Kosten Mietflächen
1.113.070 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
1.700.641 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
26.127.057 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
33.796 €
Preisgleitklausel
3.000.000 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
30.728.093 €
KG 700 Baunebenkosten
13.465.682 €
Kosten Mietflächen
1.113.078 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
1.516.718 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
27.624.988 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
33.796 €
Gesamtkosten 64.950.093 €
Gesamtkosten 75.156.374 €
Gesamtkosten 77.482.355 €
